Hankeaikataulu | Tammijärven päiväkoti | 5.2.2026

Tunnus	Task Name	Kesto	Aloitus	Valmis
1	SUUNNITTELU			
2	Suunnitteluvaihe	44 päivää	ti 25.11.2025	pe 23.1.2026
3	Aloituspalaveri / SUKO 1	1 päivä	ti 25.11.2025	ti 25.11.2025
4	Suunnittelukokous 2	1 päivä	ke 10.12.2025	ke 10.12.2025
5	Suunnittelukokous 3	1 päivä	ti 13.1.2026	ti 13.1.2026
6	Suunnitelmien yhteensovitus	5 päivää	ke 14.1.2026	ti 20.1.2026
7	Kaupalliset asiakirjat	15 päivää	ma 5.1.2026	pe 23.1.2026
8	Suunnitelmat valmiit	1 päivä	pe 23.1.2026	pe 23.1.2026
9	RAKENTAMISEN VALMISTELU			
10	Urakkalaskenta	21 päivää	ma 16.2.2026	ma 16.3.2026
11	Tarjousten jättö	1 päivä	ma 16.3.2026	ma 16.3.2026
12	Tarjouksen selonottoneuvottelu	2 päivää	ti 17.3.2026	ke 18.3.2026
13	Urakoitsijavalinta + valitusaika	18 päivää	to 19.3.2026	ma 13.4.2026
14	Urakkasopimus	1 päivä	ti 14.4.2026	ti 14.4.2026
15	RAKENTAMINEN			
16	Toteutussuunnittelu	50 päivää	ti 14.4.2026	ma 22.6.2026
17	Rakennuslupahakemuksen jättö	1 päivä	ke 6.5.2026	ke 6.5.2026
18	Rakentaminen	204 päivää	ma 18.5.2026	to 25.2.2027
19	Vastaanotto	1 päivä	pe 26.2.2027	pe 26.2.2027

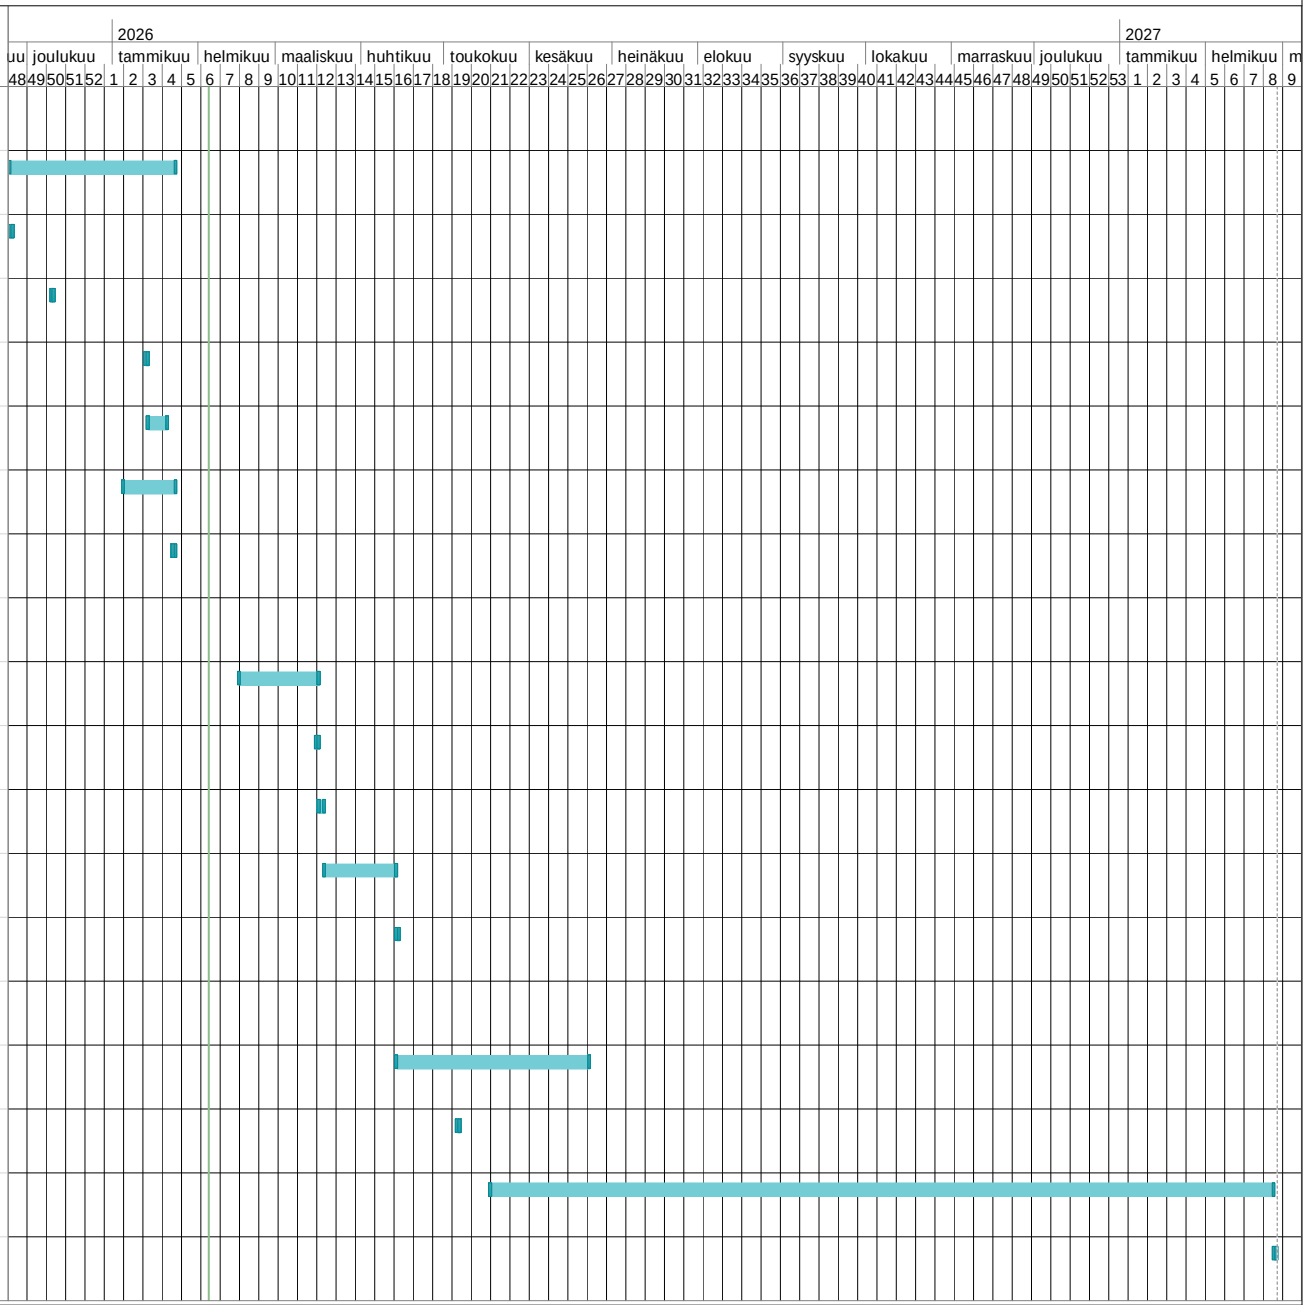

Laatija: Tommi Forsberg Sitowise Oy
